Delpi
conexões elétricas

ANÁLISE METALOGRÁFICA DE CRIMPAGEM

Avaliação da seção transversal do terminal

RELATÓRIO Nº 000001

DATA 21/10/2026 | REV. 02

01 IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

Preencha os dados do terminal, cabo e processo avaliados.

TERMINAL: DELPI-TM-100	PART NUMBER DO TERMINAL: PN-44821	PRODUTO OU CHICOTE: CHC-REV-A
CABO: CABO-1.5	SEÇÃO DO CONDUTOR: 1,50 mm²	APLICADOR / FERRAMENTA: APL-09
PRENSA / EQUIPAMENTO: PR-04	LOTE / ORDEM DE PRODUÇÃO: OP-2026-10	AMOSTRA ANALISADA: 01/05

02 ANÁLISE DA SEÇÃO TRANSVERSAL

Registre a micrografia original e a seção com análise visual.


MICROGRAFIA ORIGINAL

Imagem óptica sem marcações



SEÇÃO COM MEDIÇÕES


Área avaliada e dimensões indicadas pelo software

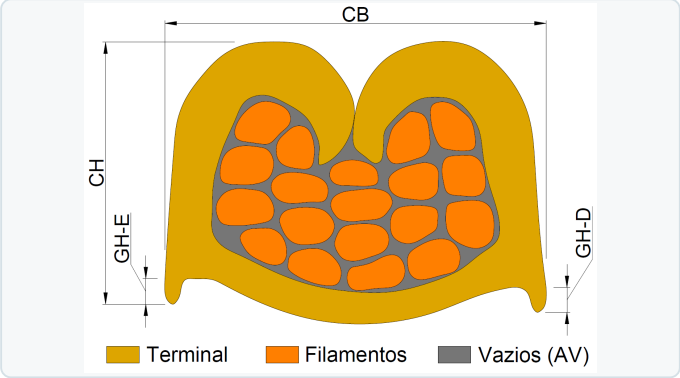

03 RESULTADOS DA MEDIÇÃO

Registre o critério aplicável e o valor obtido para cada característica.

PARÂMETRO	CRITÉRIO / TOLERÂNCIA	VALOR MEDIDO
Altura de crimpagem (CH) [mm]	1.10-1.30	1.20
Largura de crimpagem (CB) [mm]	2.00-2.20	2.10
Porcentagem de vazios (AV) [%]	<=5	4.5
Altura da rebarba esquerda (GH-E) [mm]	<=0.10	0.08
Altura da rebarba direita (GH-D) [mm]	<=0.10	0.07

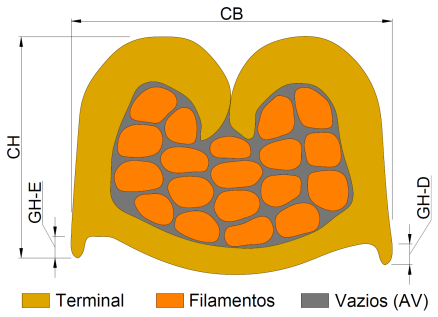

04 CONCLUSÃO TÉCNICA

Selecione o resultado final e registre observações ou desvios.

RESULTADO GERAL

☑ Conforme ☐ Não conforme

OBSERVAÇÕES / DESVIOS

Sem desvio visível na seção analisada.

05 RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

ANÁLISE REALIZADA POR: Maria Souza
